



Pontifícia
Universidade
Católica do
Rio de Janeiro

DEI
DEPARTAMENTO
DE ENGENHARIA
INDUSTRIAL



ENG 4560 – Projeto Integrado VI: Distribuição Física | 2026.1

Aula 3B: EAP e Cronograma

Prof. Marcello Congro


marcellocongro@puc-rio.br




CTC
CENTRO TÉCNICO CIENTÍFICO / PUC-Rio

Estrutura Analítica de Projeto (EAP)

- EAP é uma divisão organizada e hierárquica das atividades de projeto em componentes menores. Ela é composta por três elementos essenciais:
 - **Hierarquia** – Todas as tarefas “filhas” possuem um relacionamento hierárquico com a sua tarefa “pai”;
 - **Regra dos 100%** - A totalidade dos elementos em cada subdivisão deve representar integralmente os requisitos da atividade principal correspondente.
 - **Foco em entregas** – A EAP é estruturada com base nos resultados esperados, priorizando entregáveis ao invés de ações. Por isso, é recomendável a utilização de substantivos no segundo nível da estrutura (ao invés de verbos).

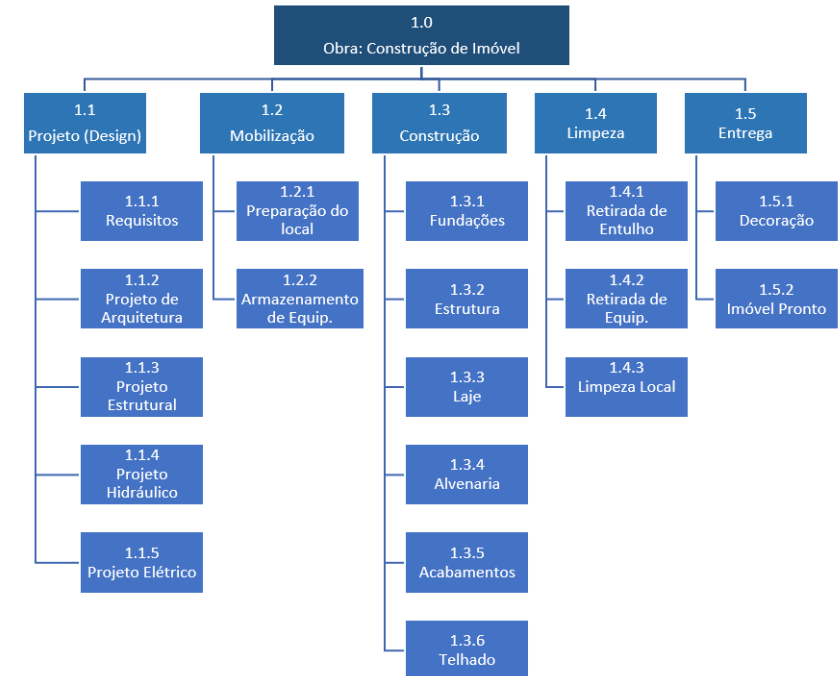


Exemplo de EAP

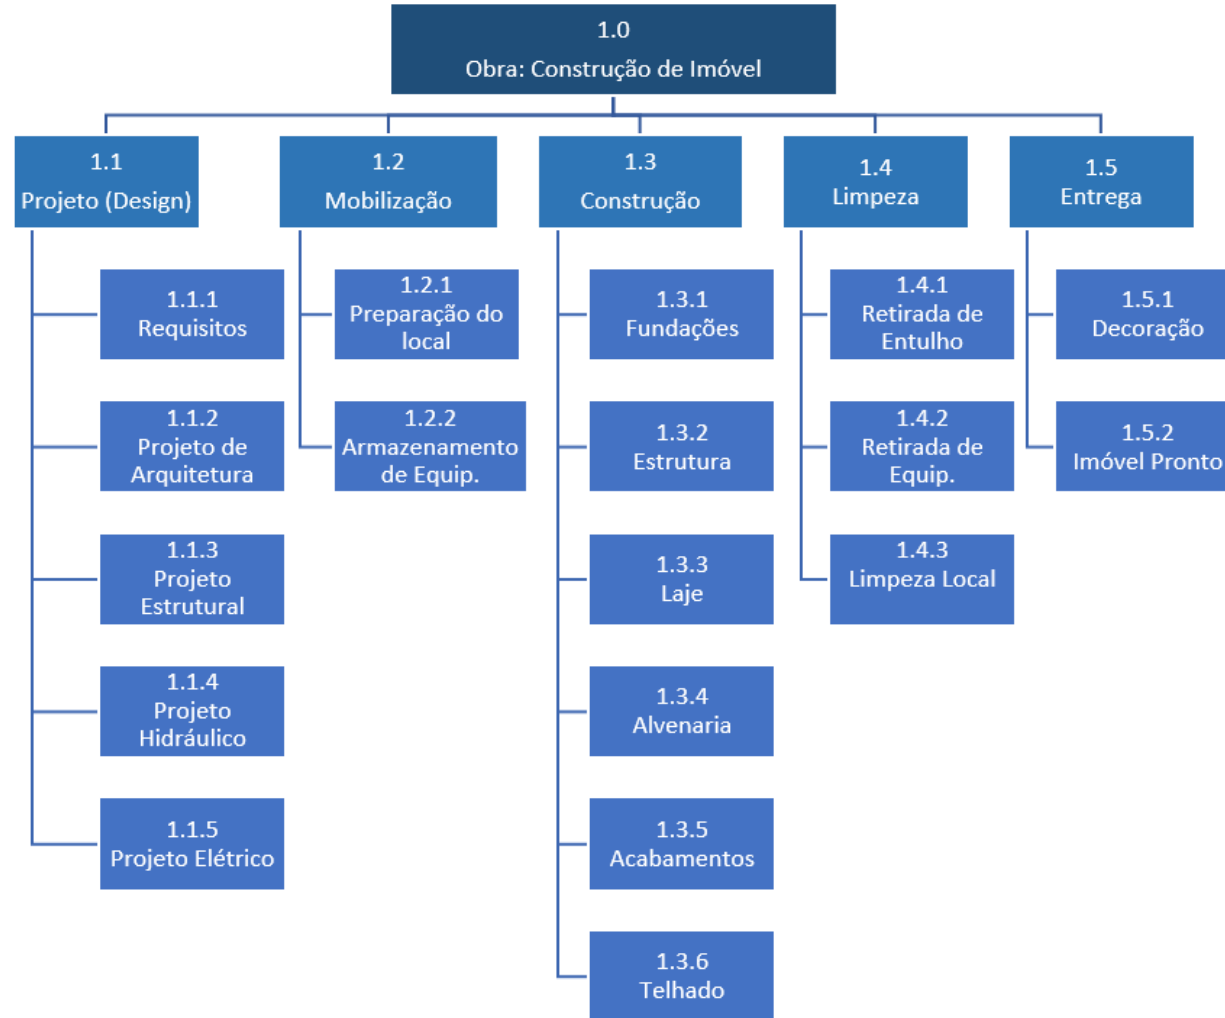

Erros comuns – EAP

- Problemas comuns na elaboração da EAP
 - Incluir tarefas recorrentes na ferramenta (exemplos: atualização do Trello, montagem de apresentação);
 - Incluir tarefas somente da Sprint 1 (a EAP deve conter todo o trabalho previsto a ser feito até o final do semestre);
 - Desrespeito às regras de hierarquia e 100% (inclusão de tarefas que não dizem respeito à tarefa pai; não incluir todas as tarefas necessárias para finalização da tarefa pai).

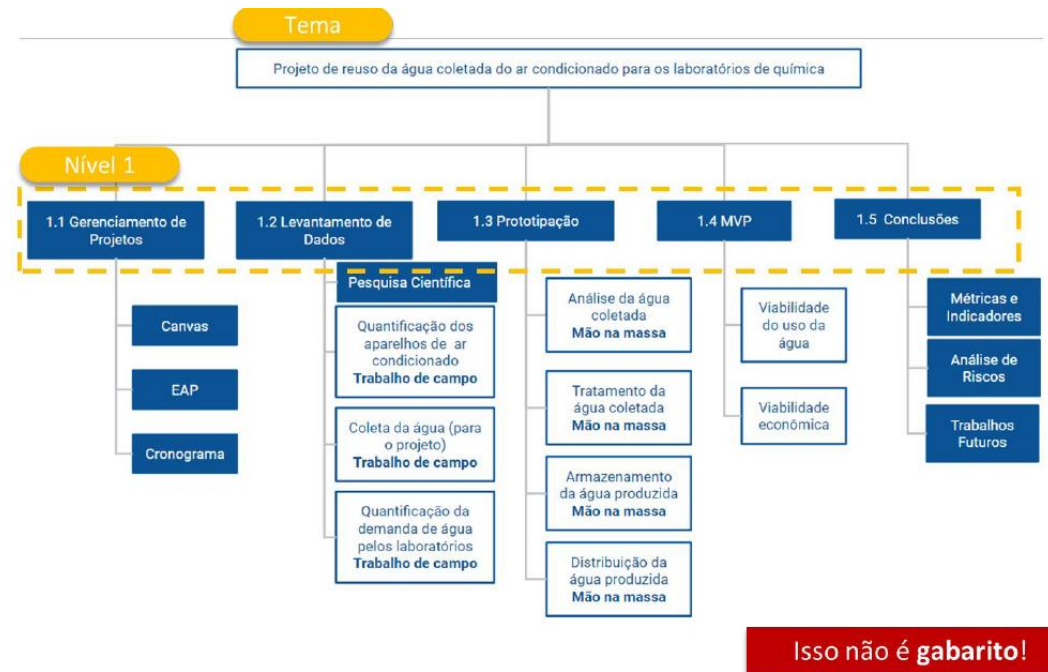

Ref.: Adaptado dos slides dos Profs. Davi Mecler e Luana Carrilho, 2024.

Cronograma

- O cronograma registra as atividades que devem ser realizadas durante o projeto, juntamente com suas datas previstas de início e término.
 - Permite identificar atrasos ou antecipações;
 - Define prazos para a finalização de cada tarefa;
 - Contribui para o acompanhamento da execução do planejamento;
 - Auxilia na definição de metas e organização dos objetivos;
 - Ajuda a prever possíveis divergências ou conflitos;
 - Serve como ferramenta para avaliar o desempenho da equipe.

Gráfico de entregas do projeto Modelo de PPT do cronograma do projeto


Project Schedule	Project XX- Customer XX- Timeline Example																											
	January				February				March				April				May				June				July			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Your Text Here																												
Project Deliverable 1																												
Project Deliverable 2																												
Project Deliverable 3																												
Project Deliverable 4																												
Project Deliverable 5																												
Project Deliverable 6																												

• This slide is 100% editable. Adapt it to your needs and capture your audience's attention.
• This slide is 100% editable. Adapt it to your needs and capture your audience's attention.

Ref.: Adaptado dos slides dos Profs. Davi Mecler e Luana Carrilho, 2024.

Erros comuns - Cronograma

- Problemas comuns na elaboração do cronograma
 - Como o cronograma é dependente da EAP, os erros cometidos são propagados (atualização do Trello, montagem de apresentação, tarefas pouco “fatiadas”);
 - Prazos pouco realísticos (ex.: construção de protótipo em 1 semana);
 - Construção do cronograma sem sequência cronológica (tarefas desordenadas – é ideal que as tarefas estejam ordenadas no cronograma com data de início crescente).

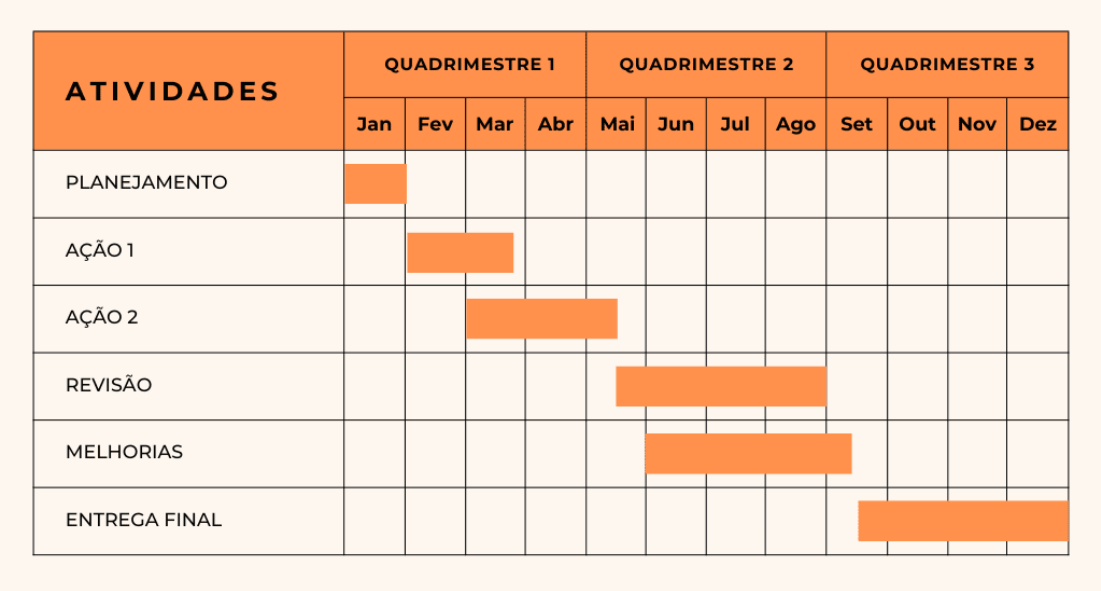

Atenção!

No final da Sprint #1, EAP e Cronograma **do projeto** deverão ser incluídos no relatório (seção “Anexos”) e apresentação da Sprint!

Para Casa – EAP e cronograma do projeto

- **Elaborar a EAP do projeto**

- ✓ Preencher nível 1 com o nome do projeto;
- ✓ Preencher nível 2 com as diferentes áreas de atuação dentro do projeto (mínimo de 4 caixinhas para o nível 2, já incluindo uma caixinha para as tarefas de gestão de projetos);
- ✓ Preencher nível 3 com as tarefas referentes a cada área de atuação (mínimo de 3 tarefas para cada área)
- ✓ OBS: Hierarquia e Regra dos 100% devem ser respeitadas.

- **Elaborar o cronograma de projeto**

- ✓ Cada tarefa do nível 3 da EAP deve ser descrita no cronograma, com sua numeração, descrição e datas estimadas de início e fim;
- ✓ Para cada linha com a tarefa, deve-se colorir de **azul** as células com o período previsto de execução. Se a célula já estiver sido executada, deve-se colorir de **verde**.



Templates da EAP e do cronograma disponíveis no Moodle!

Data de Entrega (no Moodle): 26/03/2026 (5ª feira), até 23h59min.
